

Změnový list (ZL)

ZL č./verze:	06
Datum zaevidování ZL:	15.11.2022
Datum předložení ZL:	09.12.2022

Smlouva o dílo (SoD):	
Ze dne:	18.11.2021

Ev. č. veřejné zakázky	Z2021-023993
Stavba:	Lukovany – kanalizace a ČOV
Objekt:	PS-02.1 Technologie ČOV
Název změny:	Změna odtoku z aktivační nádrže

Důvod změny a identifikace původce změny:

Rozdělovací objekt – pol.17

Rozdělovací objekt mezi dosazovacími nádržemi pro křížové zapojení DN s nátokovým systémem a hradítka pro DN150 na odtoku, nerez DIN 1.4301. - „2x otevřený široký přeliv v AN k dostatečnému odplynění směsi, kalhotový nátok do RO, kdy obě přítokové potrubí DN 150 se spojí do jednoho potrubí DN 200“.

Popis změny:

Rozdělovací objekt – pol.17

Navržené řešení je použití odplyňovacího nátokového kusu/ů s odjímatelnou nastavitelnou nornou stěnou zabraňující vniku pěny do dosazovací nádrže. Dále provedení zůstává beze změn.

Kategorizace dle §222 ZZVZ

Odstavec 4

Vyjádření technického dozoru investora

Technický dozor investora souhlasí s novým řešením.

Změna má vliv do následujících oblastí projektové dokumentace:

D.2.2.1. PS-02.1 Technologie ČOV




Přílohy:

- 1) Schéma změny

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	---
Finanční dopad:	Bez dopadu	
	Přípočty:	0,00 Kč bez DPH
	Odpočty:	0,00 Kč bez DPH
	Celkem:	0,00 Kč bez DPH

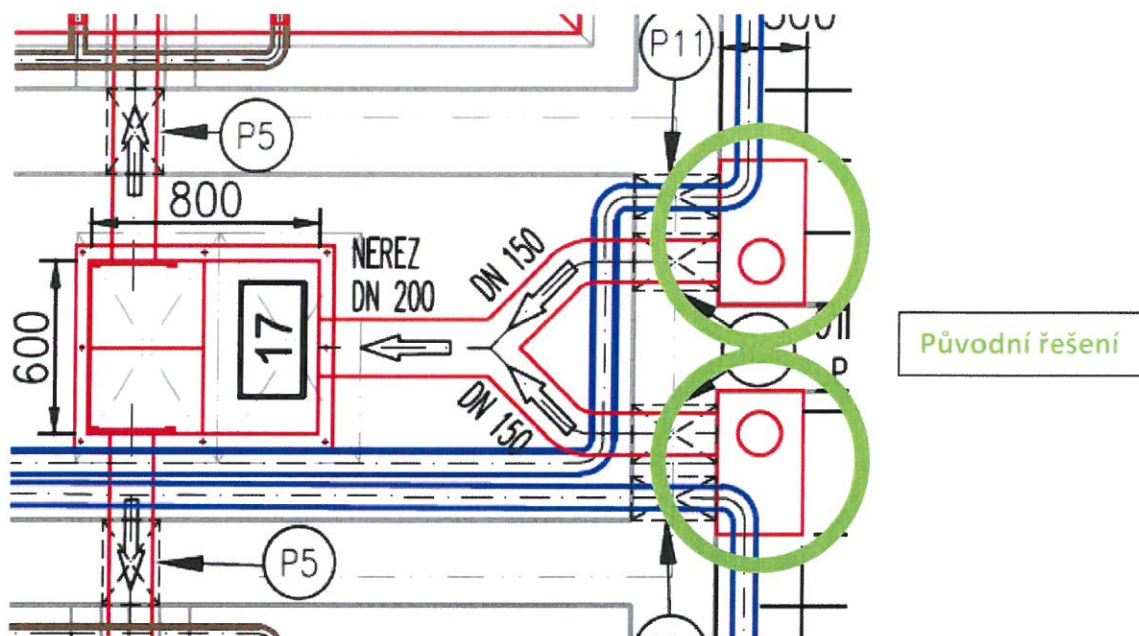
Vyjádření projektanta

Navržené řešení je jednou z možných standardních variant, u této je výhodou odnímatelná a nastavitelná norná stěna, což usnadňuje provozování zařízení. S výše popsanou změnou proto projektant souhlasí a doporučuje ji k realizaci.

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Petr Koch	21.12.22		
Za TDI:	Ing. Stanislav Jelínek	21.12.22		
Za projektanta:	Ing. Ivana Faltýnková	21.12.22		
Za zhotovitele:	Ing. Ondřej Puč	21.12.22		

ZL06 - Příloha č. 1 – Schéma změny

- 1) Původní návrh provedení, dle zadávací projektové dokumentace



- 2) Navrhované řešení provedení odplyňovacích nátokových kusů

